


PREPD 2026/2027

Planeamento da Dissertação Project Charter

Alberto Borges Pereira

abp@isep.ipp.pt

Ciclo de vida do projeto

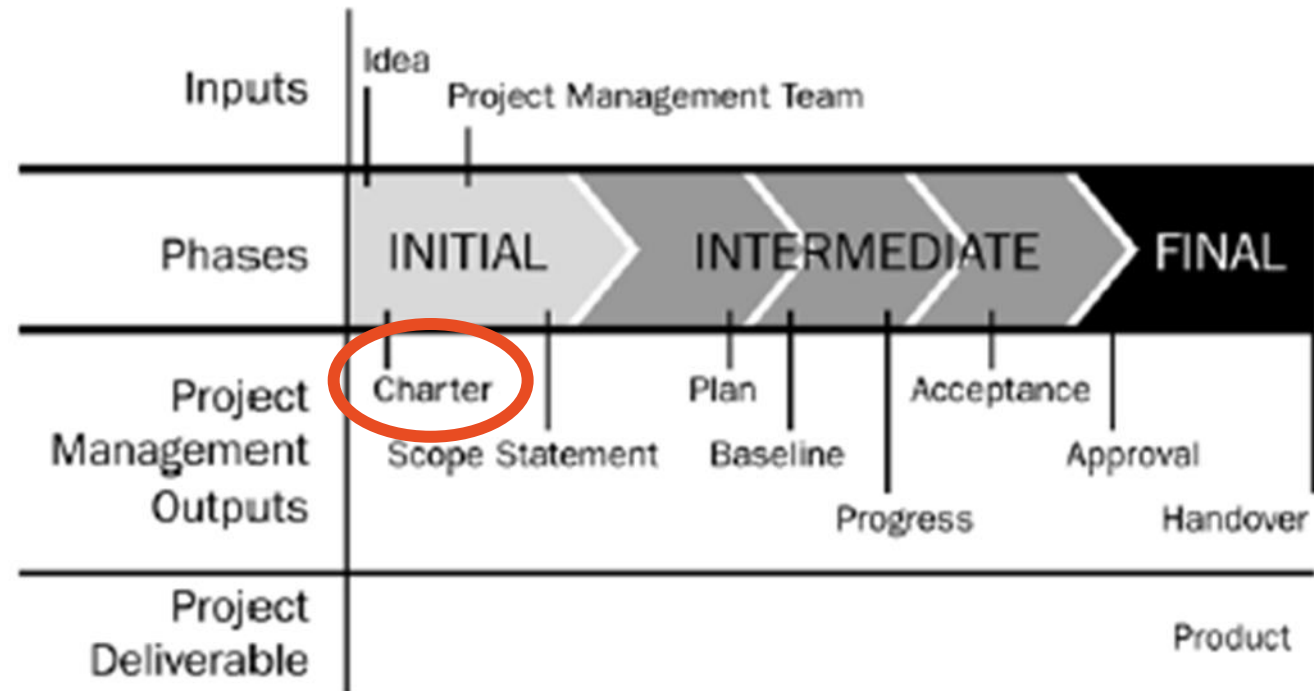

Project charter (definição)

- Autoriza e formaliza o início do projeto
- Identifica as principais partes interessadas
- Guia os próximos passos (planeamento) e todo o projeto
- Identifica condições de sucesso e de saída

Project charter (elementos)

- Stakeholders
 - Definition
 - Sponsor
- Scope
 - Objectives
 - Benefits
 - Deliverables
- Milestones
- Costs
- Assumptions, restrictions
- Risks

Project charter (elementos)

- Other elements:
 - Success metrics
 - Governance
 - Exit conditions

Project charter (elementos)

- Stakeholders
 - Todos os que possuem (holders) algo de valor (stake) para o projeto
 - ***Parte cujos interesses são afetados, positiva ou negativamente, pela implementação do projeto***
 - ***Tem capacidade de influenciar, positiva ou negativamente, a implementação do projeto***
 - Servir os seus interesses pode constituir, total ou parcialmente, o objetivo do projecto
 - Pode estar, ou não, ativamente envolvida na implementação do projeto

Project charter (elementos)

Stakeholders, exemplos:

Performing Organization:

Entidade responsável pela execução, total ou parcial, do projeto bem com pela sua gestão
Senior Management – *gestão de topo responsável pela aprovação e cancelamento do projeto*
Functional Managers – *gestores responsáveis pelas áreas funcionais*
Project Manager – *gestor responsável pela consecução dos objetivos operacionais do projeto*
Project Team Members – *membros da equipa do projeto responsáveis pela execução do projeto*
Other Project Managers – *outros gestores de projeto que podem partilhar recursos*

Client / Customer:

Senior Management – *gestão de topo responsável pela “compra” do projeto. Paga o “preço”.*
Users – *utilizadores finais do produto do projeto*

Sponsor:

Entidade interna ou externa à performing organization que financia total ou parcialmente a implementação do projeto. Paga o “custo” do projeto ou resolve conflitos / impedimentos.

Supplier / Vendor / Subcontractor:


Fornecedor de matérias primas ou serviços, que podem incluir parte do trabalho do projeto

Non-Profit Organizations:

Entidades de carácter regulador, cujos interesses são afetados pelo projeto, sendo por vezes a sua aprovação formalmente necessária. (organizações governamentais, ecológicas, sindicatos, etc.).

Project charter (elementos)

- Stakeholders, exemplos:

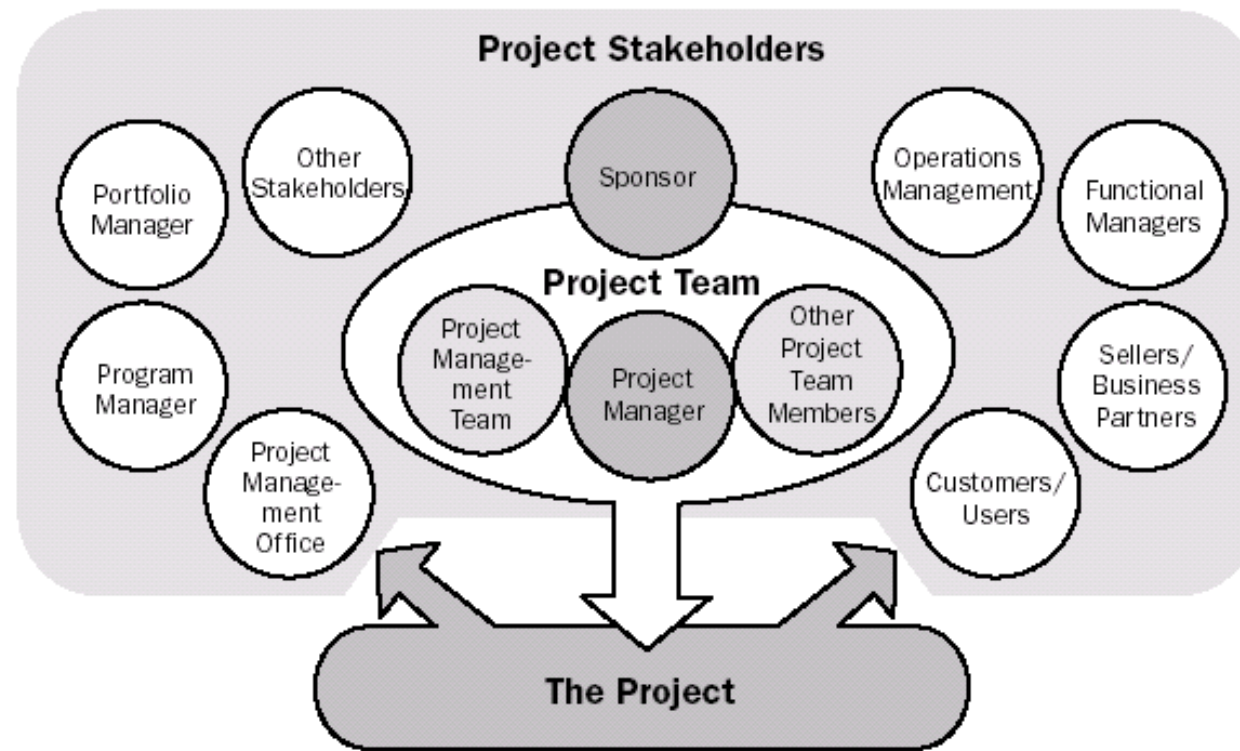

Project charter (elementos)

- **Stakeholders, método:**
 - Identificação
 - Categorização e classificação
 - Análise
 - Prioritização
 - Envolvimento
 - Monitorização
- **Stakeholders, técnicas:**
 - Matriz de Poder x Interesse
 - Integrada com:
 - plano de comunicação
 - e riscos


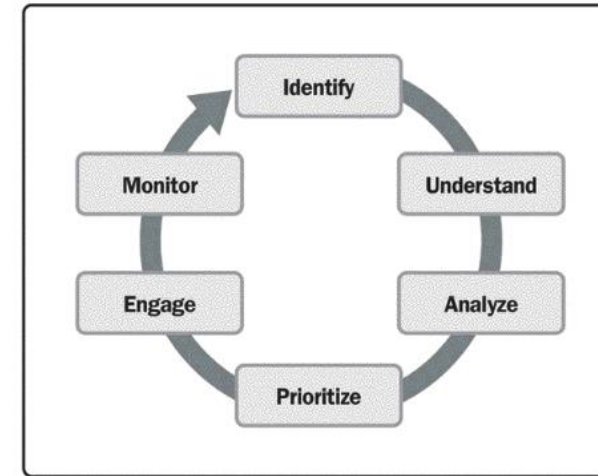


Figure 2-3. Navigating Effective Stakeholder Engagement

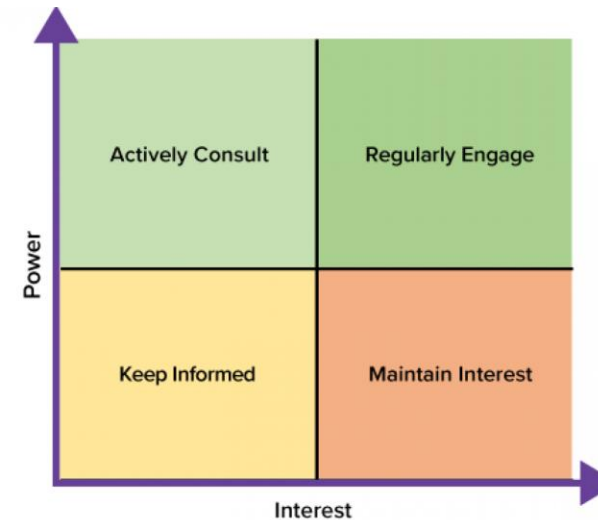

Project charter (elementos)

- Scope (Âmbito)
 - Âmbito do Produto: O que se espera que o produto seja
 - Âmbito do Projecto: O que se espera que o projecto faça
 - Requisitos:
 - Técnicos, Funcionais, Qualidade, etc.
 - Deliverable / Entregável: Entrega do projecto
 - Work Package: Um pacote de trabalho pode ser descrito, estimado, agendado, monitorizado e controlado
 - Restrições, Pressupostos, Exclusões
 - Elaboração progressiva, Rolling Wave
 - Scope Creep, Gold Plating
 - Scope change control (procedimento de registo de alterações)

Project charter (elementos)

- Scope

- Benefits

“The positive impacts and value derived from successfully completing a project. These benefits can be both quantitative and qualitative, ranging from financial gains and cost reductions to improved customer satisfaction and strategic positioning.”

- Deliverables

“Any unique and verifiable product, result, or capability that must be produced to complete a process, phase, or project.”


- Physical or non-physical
 - Acceptance criteria
 - Progress measurement

Project charter (elementos)

- Deliverables (Entregáveis):
 - Incluem
 - Elementos que compõem o produto ou serviço
 - Resultados auxiliares (documentação, gestão de projecto,...)
 - Podem ser identificados em função de:
 - Natureza do produto (Exº Documentação, Software, Formação,...)
 - Arquitectura técnica do produto (Exº de Válvulas, Casco, Motor,...)
 - Funcionalidade a entregar (Exº Funcionalidades de facturação, venda,..)


Project charter (elementos)

- Time
 - Milestones
 - Deadlines
 - Durations (estimates)
 - Start and finish dates
 - Dependencies

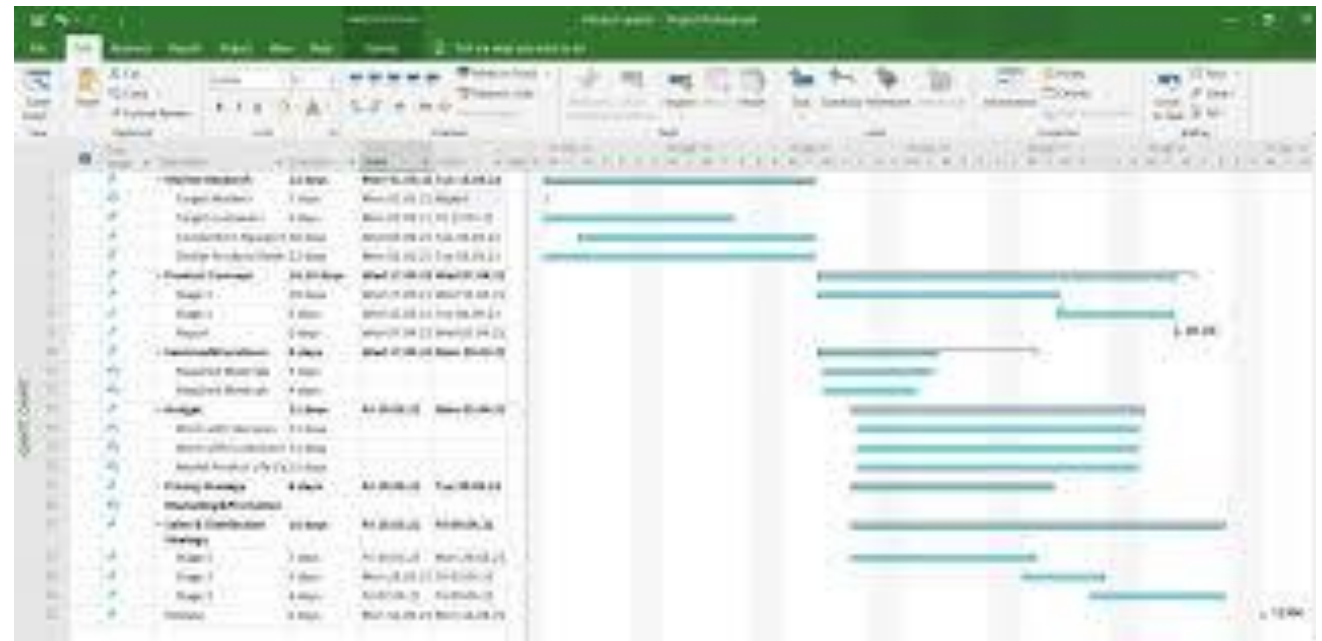

Project charter (elementos)

- Cost
 - Work
 - Material
 - Cost

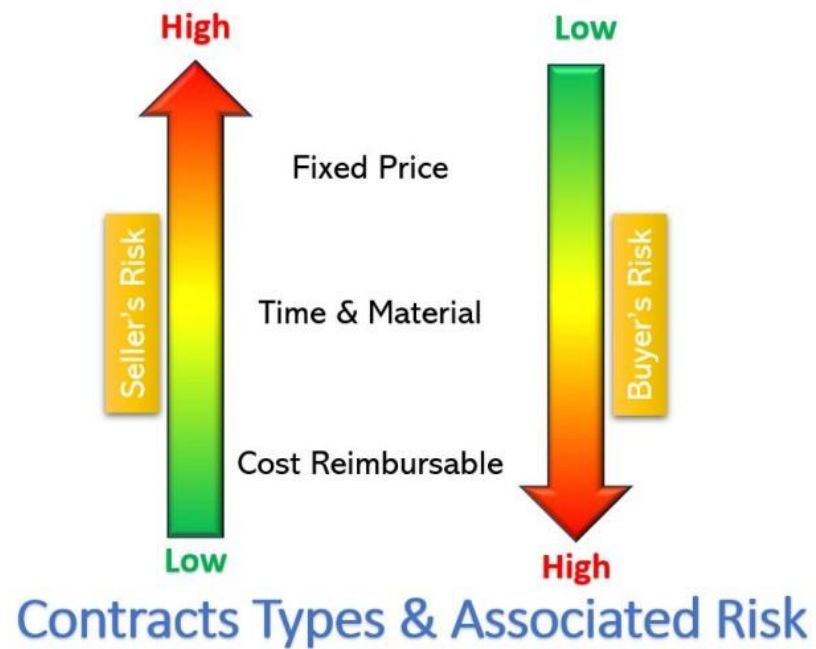

Project charter (elementos)


- Risk
 - Cause
 - Effect
 - Response plan
 - Contingency plan

*The PMBOK® Guide describes risk as, **An uncertain event or condition, that if it occurs, has a positive or negative effect on a project's objective***



Abordagem ao desenvolvimento

WATERFALL vs AGILE

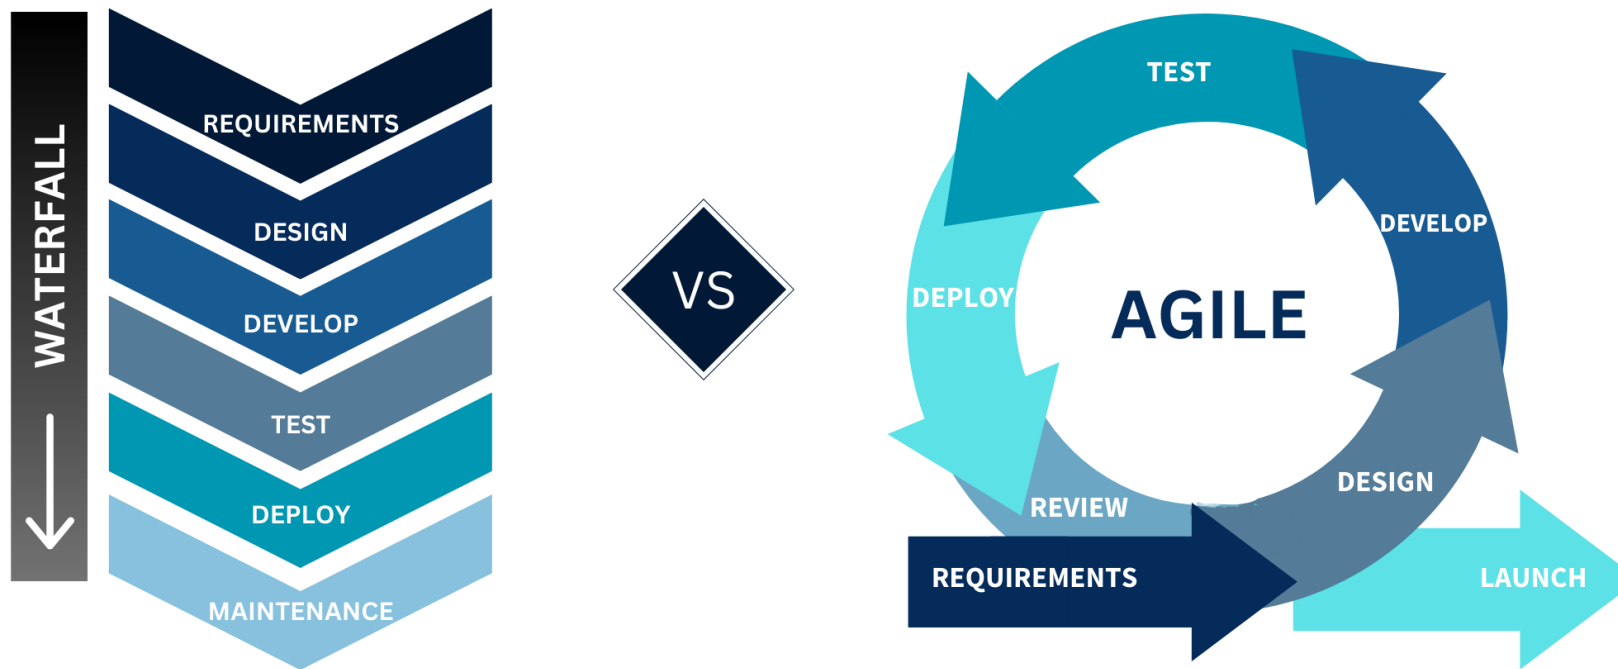

Gestão de Projetos

PREPD 2025/2026

Alberto Borges Pereira

abp@isep.ipp.pt
